

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**CRIACION DE LA CICLOVIA COMPRENDIDO ENTRE EL TRAMO AV.CUTERVO Y LA AV.HUACACHINA DEL DISTRITO DE ICA-ICA**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
2	INICIO	0 días	sáb 26/04/25	sáb 26/04/25	
3	**OBRAS PROVISIONALES Y PRELIMINARES**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
4	**OBRAS PROVISIONALES**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
5	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	
6	ALQUILER DE PATIO DE MAQUINAS	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	5CC
7	OFC. PERSONAL CLAVE Y ADMINISTRATIVO, CASETA DE COMEDOR Y VIGILANCIA	200 días	sáb 26/04/25	mar 11/11/25	5CC
8	ALQUILER DE LAVADEROS Y SS.HH P/ INST. OFC.	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	
9	CARTEL DE OBRA DE 3.60 X 2.40	2 días	sáb 26/04/25	dom 27/04/25	6CC
10	MALLA DE SEGURIDAD	535 días	jue 1/05/25	sáb 17/10/26	5CC+5 días
11	FLETE TERRESTRE PARA LA OBRA	360 días	lun 26/05/25	mié 20/05/26	5CC+30 días
12	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**510 días**	**lun 26/05/25**	**sáb 17/10/26**	
13	LIMPIEZA ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA OBRA	480 días	mié 25/06/25	sáb 17/10/26	5CC+60 días
14	TALA Y RETIRO DE ARBOLES MAYORES DE 4M Y ELIMINA	260 días	mar 23/09/25	mar 9/06/26	5CC+150 días
15	TALA Y RETIRO DE ARBOLES MENORES DE 4M Y ELIMINA	260 días	mar 23/09/25	mar 9/06/26	14CC
16	ELIMINACION DE MALEZA Y GRASS DE FACIL EXTRACCIO	230 días	mié 25/06/25	lun 9/02/26	5CC+60 días
17	RETIRO DE LETREROS MAYORES A 5 METROS	3 días	mié 12/11/25	vie 14/11/25	5CC+200 días
18	RETIRO DE LETREROS MENORES A 5 METROS	3 días	dom 22/03/26	mar 24/03/26	5CC+330 días
19	DEMOLICION DE VEREDAS, MARTILLOS,LOSAS Y RAMPA	230 días	mié 25/06/25	lun 9/02/26	5CC+60 días
20	DEMOLICIÓN DE SARDINELES SUMERGIDO DE CONCRET	230 días	mié 25/06/25	lun 9/02/26	5CC+60 días
21	DEMOLICIÓN DE SARDINELES DE CONCRETO, H promedi	160 días	mié 25/06/25	lun 1/12/25	5CC+60 ES
22	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	320 días	lun 26/05/25	vie 10/04/26	5CC+30 días
23	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	320 días	lun 26/05/25	vie 10/04/26	22CC
24	ELIMINACION DE MATERIAL PROCEDENTE DE DEMOLICI	320 días	lun 26/05/25	vie 10/04/26	23CC
25	**VEREDAS**	**275 días**	**mar 23/09/25**	**mié 24/06/26**	
26	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**200 días**	**mar 23/09/25**	**vie 10/04/26**	
27	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	200 días	mar 23/09/25	vie 10/04/26	19CC+90 días
28	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**210 días**	**lun 29/09/25**	**dom 26/04/26**	
29	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	210 días	lun 29/09/25	dom 26/04/26	27CC+6 días
30	EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS EN VEREDAS	210 días	lun 29/09/25	dom 26/04/26	29CC
31	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN VERE	210 días	lun 29/09/25	dom 26/04/26	30CC
32	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	210 días	lun 29/09/25	dom 26/04/26	29CC
33	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	210 días	lun 29/09/25	dom 26/04/26	32FF
34	**BASES GRANULAR**	**200 días**	**jue 9/10/25**	**dom 26/04/26**	
35	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULA	200 días	jue 9/10/25	dom 26/04/26	31CC+10 días
36	**VEREDAS DE CONCRETO**	**203 días**	**vie 10/10/25**	**jue 30/04/26**	
37	ENCOFRADO Y DESENC. PARA VEREDAS	200 días	vie 10/10/25	lun 27/04/26	35CC+1 día
38	VEREDAS DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2, E= 0.10M	200 días	lun 13/10/25	jue 30/04/26	37CC+3 días
39	UÑAS DE VEREDAS DE CONCRETO F'C =175 KG/CM2	200 días	lun 13/10/25	jue 30/04/26	38CC
40	ACABADO PULIDO	200 días	lun 13/10/25	jue 30/04/26	39CC
41	BRUÑAS SEGUN DETALLE	200 días	lun 13/10/25	jue 30/04/26	40CC
42	CURADO DE VEREDAS	200 días	lun 13/10/25	jue 30/04/26	41CC
43	**JUNTAS**	**45 días**	**lun 11/05/26**	**mié 24/06/26**	
44	LIMPIEZA SUPERFICIE DE JUNTAS	15 días	lun 11/05/26	lun 25/05/26	42FC+10 días
45	JUNTA DE DILATACION ASFÁLTICA e=1"	30 días	mar 26/05/26	mié 24/06/26	44
46	**OTROS**	**206 días**	**lun 13/10/25**	**mié 6/05/26**	
47	REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE REGISTRO PARA	200 días	lun 13/10/25	jue 30/04/26	38CC
48	REPOSICION Y NIVELACION DE CAJA DE AGUA	200 días	lun 13/10/25	jue 30/04/26	38CC
49	RETIRO Y REPOSICION DE MURETES DE MEDIDORES	6 días	vie 1/05/26	mié 6/05/26	38
50	**MARTILLO Y RAMPAS**	**190 días**	**jue 23/10/25**	**jue 30/04/26**	
51	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**190 días**	**jue 23/10/25**	**jue 30/04/26**	
52	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	38CC+10 días
53	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**190 días**	**jue 23/10/25**	**jue 30/04/26**	
54	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	52CC
55	EXCAVACION MANUAL PARA UÑAS EN MARTILLOS	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	54CC
56	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE EN MART	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	55CC
57	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	56CC
58	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	57CC
59	**BASES GRANULAR**	**190 días**	**jue 23/10/25**	**jue 30/04/26**	
60	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE GRANULA	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	58CC
61	**CONCRETO SIMPLE**	**190 días**	**jue 23/10/25**	**jue 30/04/26**	
62	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA MARTILL	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	60CC
63	MARTILLOS Y RAMPAS CONCRETO FC=175KG/CM2	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	62CC
64	CONCRETO DE UÑAS DE MARTILLOS FC=175KG/CM2	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	63CC
65	ACABADO PULIDO	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	64CC
66	BRUÑAS SEGUN DETALLE	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	65CC
67	CURADO DE MARTILLOS Y RAMPAS	190 días	jue 23/10/25	jue 30/04/26	66CC
68	**SARDINELES PERALTADOS**	**338 días**	**sáb 4/10/25**	**dom 6/09/26**	
69	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**150 días**	**sáb 4/10/25**	**lun 2/03/26**	
70	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE SARDINELES PERA	150 días	sáb 4/10/25	lun 2/03/26	160CC+125 días
71	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**164 días**	**sáb 11/10/25**	**lun 23/03/26**	
72	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINELES	150 días	sáb 11/10/25	lun 9/03/26	70CC+7 días
73	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	150 días	sáb 25/10/25	lun 23/03/26	72CC+14 días
74	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	150 días	sáb 25/10/25	lun 23/03/26	73CC
75	**CONCRETO SIMPLE DE SARDINEL PERALTADO**	**180 días**	**mié 29/10/25**	**dom 26/04/26**	
76	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINELES PERALTAD	180 días	mié 29/10/25	dom 26/04/26	78CC
77	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA SARDINELES PERALT	180 días	mié 29/10/25	dom 26/04/26	76CC
78	ACERO FY= 4200 kg/cm2, EN SARDINELES PERALTADOS	180 días	mié 29/10/25	dom 26/04/26	74CC+4 días
79	CURADO DE SARDINEL PERALTADO	180 días	mié 29/10/25	dom 26/04/26	77FF
80	**ACABADOS**	**313 días**	**mié 29/10/25**	**dom 6/09/26**	
81	ACABADO PULIDO	180 días	mié 29/10/25	dom 26/04/26	77FF
82	VESTIDURA DE DERRAMES CON BORDES BOLEADOS	245 días	mié 29/10/25	mar 30/06/26	81CC
83	PINTADO DE LAS CARA VISTA DEL SARDINEL PERALTADO	35 días	lun 3/08/26	dom 6/09/26	86FC+3 días
84	**JUNTAS**	**30 días**	**mié 1/07/26**	**jue 30/07/26**	
85	LIMPIEZA SUPERFICIE DE JUNTAS	30 días	mié 1/07/26	jue 30/07/26	82
86	JUNTA DE DILATACION ASFÁLTICA e=1"	30 días	mié 1/07/26	jue 30/07/26	85CC
87	**SARDINELES SUMERGIDOS**	**188 días**	**dom 1/02/26**	**vie 7/08/26**	
88	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**99 días**	**dom 1/02/26**	**dom 10/05/26**	
89	TRAZO Y REPLANTEO PARASARDINELES SUMERGIDOS	99 días	dom 1/02/26	dom 10/05/26	160CC+245 días
90	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**119 días**	**dom 1/02/26**	**sáb 30/05/26**	
91	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO PARA SARDINELES	119 días	dom 1/02/26	sáb 30/05/26	89CC
92	EXCAVACION EN LADO DEL SARDINEL SUMERGIDO PAR/	119 días	dom 1/02/26	sáb 30/05/26	91CC
93	RELLENO DE TERRENO NATURAL EN LADO DEL JARDIN	119 días	dom 1/02/26	sáb 30/05/26	92CC
94	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	119 días	dom 1/02/26	sáb 30/05/26	93FF
95	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MAQUINA	119 días	dom 1/02/26	sáb 30/05/26	94FF
96	**CONCRETO DE SARDINEL SUMERGIDOS**	**150 días**	**dom 1/02/26**	**mar 30/06/26**	
97	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINEL SUMERGI	119 días	dom 1/02/26	sáb 30/05/26	95CC
98	CONCRETO EN SARDINEL F'C=175 KG/CM2	119 días	dom 1/02/26	sáb 30/05/26	99CC
99	ACERO FY= 4200 kg/cm2, EN SARDINELES SUMERGIDOS	119 días	dom 1/02/26	sáb 30/05/26	97CC
100	CURADO DE SARDINEL SUMERGIDO	150 días	dom 1/02/26	mar 30/06/26	98CC
101	**ACABADOS**	**150 días**	**dom 1/02/26**	**mar 30/06/26**	
102	ACABADO PULIDO	150 días	dom 1/02/26	mar 30/06/26	100CC
103	**JUNTAS**	**35 días**	**sáb 4/07/26**	**vie 7/08/26**	
104	LIMPIEZA SUPERFICIE DE JUNTAS	5 días	sáb 4/07/26	mié 8/07/26	102FC+3 días
105	JUNTA DE DILATACION ASFÁLTICA e=1"	30 días	jue 9/07/26	vie 7/08/26	104
106	**ADOQUINES**	**129 días**	**sáb 2/05/26**	**lun 7/09/26**	
107	**TRABAJOS PRELIMINARES**	**99 días**	**sáb 2/05/26**	**sáb 8/08/26**	
108	TRAZO Y REPLANTEO DE ADOQUINES	99 días	sáb 2/05/26	sáb 8/08/26	98CC+90 días;14FC
109	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**129 días**	**sáb 2/05/26**	**lun 7/09/26**	
110	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	99 días	sáb 2/05/26	sáb 8/08/26	108CC
111	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	99 días	sáb 2/05/26	sáb 8/08/26	110CC
112	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	99 días	sáb 2/05/26	sáb 8/08/26	111CC
113	CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA ADOQUIN E	129 días	sáb 2/05/26	lun 7/09/26	112CC
114	CAMA DE ARENA GRUESA DE 2"	99 días	lun 1/06/26	lun 7/09/26	113CC+30 días
115	**ACABADOS**	**99 días**	**lun 1/06/26**	**lun 7/09/26**	
116	REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRET	99 días	lun 1/06/26	lun 7/09/26	114CC
117	REVESTIMIENTO DE PISO CON ADOQUINES DE CONCRET	89 días	lun 1/06/26	vie 28/08/26	116CC
118	SELLADO DE JUNTAS DE ADOQUIN CON ARENA	99 días	lun 1/06/26	lun 7/09/26	117CC
119	**AREAS VERDES**	**190 días**	**sáb 11/04/26**	**sáb 17/10/26**	
120	**SUMINISTRO E INSTALACION DE AREAS VERDES**	**190 días**	**sáb 11/04/26**	**sáb 17/10/26**	
121	CORTE SUPERFICIAL MANUAL	50 días	sáb 11/04/26	sáb 30/05/26	98FF
122	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	50 días	sáb 11/04/26	sáb 30/05/26	121CC
123	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA DE CHACRA	40 días	lun 7/09/26	vie 16/10/26	83;124FC+9 días
124	COLOCACION DE BLOCK GRASS	140 días	sáb 11/04/26	vie 28/08/26	128CC;38FC-40 día
125	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRASS NATURAL	40 días	mar 8/09/26	sáb 17/10/26	123CC+1 día
126	SEMBRADO DE PALMERAS INCL. SUMIN. Y COLOCACION	40 días	mar 8/09/26	sáb 17/10/26	123CC+1 día
127	CONFORMACION DE BASE GRANULAR PARA BLOCK GRA	140 días	sáb 11/04/26	vie 28/08/26	121FC-50 días
128	CAMA DE ARENA GRUESA E= 3 cm	140 días	sáb 11/04/26	vie 28/08/26	127CC
129	**PAVIMENTACIÓN**	**415 días**	**mié 28/05/25**	**jue 16/07/26**	
130	**TRAMO I**	**355 días**	**vie 27/06/25**	**mar 16/06/26**	
131	**OBRAS PRELIMINARES**	**90 días**	**vie 27/06/25**	**mié 24/09/25**	
132	TRAZO Y REPLANTEO	90 días	vie 27/06/25	mié 24/09/25	5CC+62 días
133	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**320 días**	**vie 27/06/25**	**mar 12/05/26**	
134	CORTE DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA PARA P	320 días	vie 27/06/25	mar 12/05/26	132CC
135	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE DE PAV	320 días	vie 27/06/25	mar 12/05/26	134CC
136	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.10M (over mas	320 días	vie 27/06/25	mar 12/05/26	135CC
137	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	3 días	vie 27/06/25	dom 29/06/25	136CC
138	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	320 días	vie 27/06/25	mar 12/05/26	137CC
139	**SUB BASES Y BASES**	**320 días**	**vie 27/06/25**	**mar 12/05/26**	
140	SUB BASE GRANULA E=0.26M	320 días	vie 27/06/25	mar 12/05/26	138CC
141	BASE GRANULAR E=0.20M	320 días	vie 27/06/25	mar 12/05/26	140CC

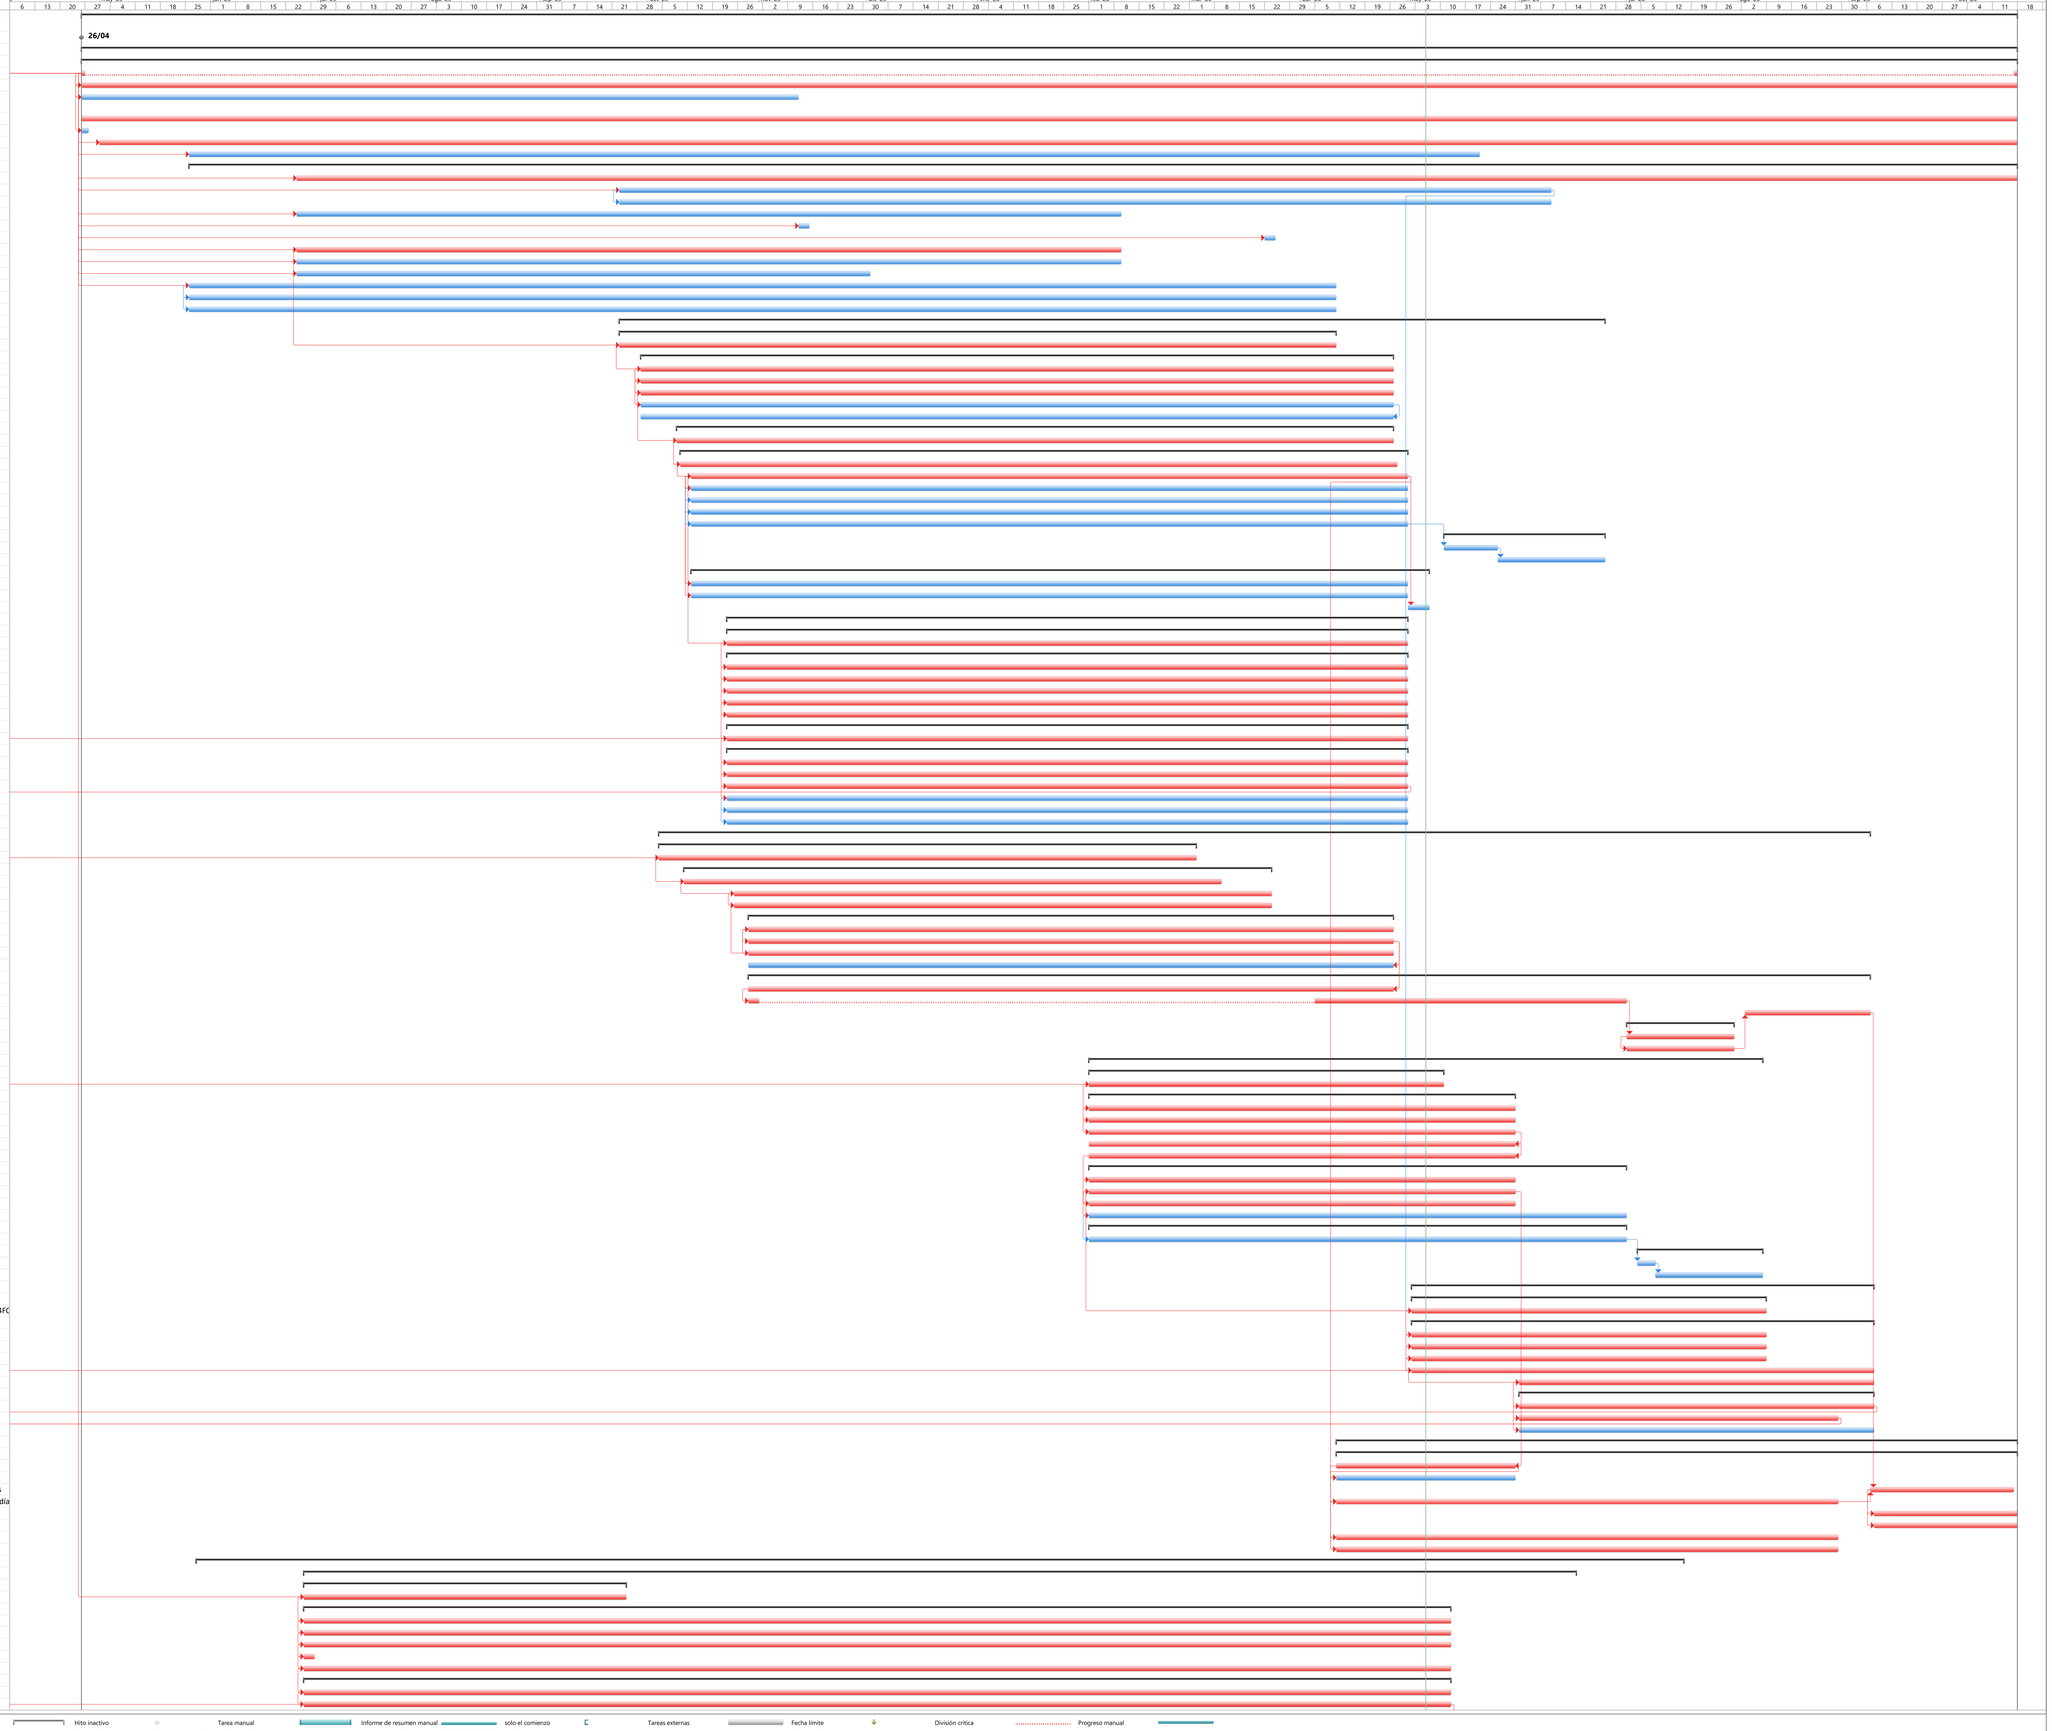

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
142	**PAVIMENTOS**	**265 días**	**jue 25/09/25**	**mar 16/06/26**	
143	IMPRIMACION ASFALTICA	260 días	jue 25/09/25	jue 11/06/26	141CC+90 días
144	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 3"	260 días	vie 26/09/25	vie 12/06/26	143CC+1 día
145	SELLADO ASFALTICO	12 días	vie 5/06/26	mar 16/06/26	144FF+4 días
146	**OTROS**	**140 días**	**jue 14/08/25**	**mié 31/12/25**	
147	NIVELACION DE LOSA Y TAPA DE BUZON DE CONCRET	140 días	jue 14/08/25	mié 31/12/25	141FF-132 días
148	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA DE '	140 días	jue 14/08/25	mié 31/12/25	147FF
149	**TRAMO II**	**415 días**	**mié 28/05/25**	**jue 16/07/26**	
150	**OBRAS PRELIMINARES**	**120 días**	**mié 28/05/25**	**mié 24/09/25**	
151	TRAZO Y REPLANTEO	120 días	mié 28/05/25	mié 24/09/25	5CC+32 días
152	**MOVIMIENTO DE TIERRA**	**364 días**	**mié 28/05/25**	**mar 26/05/26**	
153	CORTE DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA PARA P	360 días	mié 28/05/25	vie 22/05/26	151CC
154	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUBRASANTE DE PAV	360 días	dom 1/06/25	mar 26/05/26	153CC+4 días
155	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE E=0.15M (over ma	360 días	dom 1/06/25	mar 26/05/26	154CC
156	TERRAPLENES CON MATERIAL DE CANTERA	10 días	dom 1/06/25	mar 10/06/25	153CC+4 días
157	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	360 días	mié 28/05/25	vie 22/05/26	153CC
158	**SUB BASES Y BASES**	**360 días**	**dom 1/06/25**	**mar 26/05/26**	
159	SUB BASE GRANULAR E=0.26M	360 días	dom 1/06/25	mar 26/05/26	155CC
160	BASE GRANULAR E=20 m	360 días	dom 1/06/25	mar 26/05/26	159CC
161	**PAVIMENTOS**	**38 días**	**mar 9/06/26**	**jue 16/07/26**	
162	IMPRIMACION ASFALTICA	20 días	mar 9/06/26	dom 28/06/26	160FC+8 días;180C
163	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 3"	20 días	jue 11/06/26	mar 30/06/26	162CC+2 días;64FC
164	SELLADO ASFALTICO	16 días	mié 1/07/26	jue 16/07/26	163
165	**OTROS**	**10 días**	**lun 1/06/26**	**mié 10/06/26**	
166	NIVELACION DE LOSA Y TAPA DE BUZON DE CONCRET	10 días	lun 1/06/26	mié 10/06/26	160FC+5 días
167	ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSA DE '	10 días	lun 1/06/26	mié 10/06/26	166FF
168	**SEÑALIZACION VIAL Y SEMAFORIZACION**	**104 días**	**lun 6/07/26**	**sáb 17/10/26**	
169	**SEÑALIZACION VIAL**	**104 días**	**lun 6/07/26**	**sáb 17/10/26**	
170	SEÑAL INFORMATIVA	7 días	lun 6/07/26	dom 12/07/26	163FC+5 días
171	SEÑAL PREVENTIVA	7 días	lun 13/07/26	dom 19/07/26	170
172	SEÑAL REGLAMENTARIA	7 días	lun 20/07/26	dom 26/07/26	171
173	POSTE DE SOPORTE PARA SEÑALES	21 días	lun 6/07/26	dom 26/07/26	170CC
174	MARCAS EN EL PAVIMENTO	60 días	jue 6/08/26	dom 4/10/26	164FC+20 días;145
175	PINTURA DE TRAFICO CONTINUA Y DISCONTINUA	65 días	jue 6/08/26	vie 9/10/26	174CC
176	PINTADO DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS	6 días	sáb 10/10/26	jue 15/10/26	175
177	REDUCTOR DE CAUCHO	2 días	vie 16/10/26	sáb 17/10/26	176
178	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**286 días**	**lun 22/12/25**	**sáb 3/10/26**	
179	**PRELIMINARES**	**120 días**	**sáb 6/06/26**	**sáb 3/10/26**	
180	REUBICACION DE POSTES DE MEDIA TENSION	120 días	sáb 6/06/26	sáb 3/10/26	160CC+370 días
181	REUBICACION DE POSTES DE BAJA TENSION	120 días	sáb 6/06/26	sáb 3/10/26	180CC
182	**SEMAFORIZACION**	**275 días**	**lun 22/12/25**	**mar 22/09/26**	
183	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**160 días**	**lun 22/12/25**	**sáb 30/05/26**	
184	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS	160 días	lun 22/12/25	sáb 30/05/26	60CC+60 días
185	**ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE**	**160 días**	**lun 22/12/25**	**sáb 30/05/26**	
186	ACARREO MATERIAL EXCEDENTE	160 días	lun 22/12/25	sáb 30/05/26	184CC
187	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	160 días	lun 22/12/25	sáb 30/05/26	186CC
188	**CONCRETO ARMADO**	**150 días**	**lun 22/12/25**	**mié 20/05/26**	
189	CONCRETO PREMEZCLADO f'c= 210 kg/cm2 CMTO TIF	150 días	lun 22/12/25	mié 20/05/26	190CC
190	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO P/BASES EN SEMÁFOI	150 días	lun 22/12/25	mié 20/05/26	191CC
191	ACERO DE REFUERZO Fy=4200 GRADO 60 EN SEMAFC	150 días	lun 22/12/25	mié 20/05/26	184CC
192	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLI**	**11 días**	**lun 1/06/26**	**jue 11/06/26**	
193	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALI	5 días	lun 1/06/26	vie 5/06/26	189FC+11 días
194	POSTE PARA SEMAFORO (L=6.00M.)	1 día	sáb 6/06/26	sáb 6/06/26	193
195	POSTE PARA SEMAFORO PEATONAL (L=4M)	3 días	dom 7/06/26	mar 9/06/26	194
196	PORTICO PARA SEMAFORO (L=30M)	2 días	mié 10/06/26	jue 11/06/26	195
197	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLES ELÉCTRICOS P.**	**91 días**	**mar 2/06/26**	**lun 31/08/26**	
198	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL I	18 días	sáb 1/08/26	mar 18/08/26	203
199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE CONTROL I	18 días	sáb 1/08/26	mar 18/08/26	198CC
200	SUMINISTRO E INSTALA CABLE DE ACOMETIDA 2x4 M	18 días	sáb 1/08/26	mar 18/08/26	199CC
201	SUMINISTRO E INSTALA CABLE ELECTRICO 1X10 MM2	18 días	sáb 1/08/26	mar 18/08/26	200CC
202	CAJA DE PASE TIPO CE-2	60 días	mar 2/06/26	vie 31/07/26	184FC+2 días
203	CANALIZACIÓN PARA LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS	60 días	mar 2/06/26	vie 31/07/26	184FC+2 días
204	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	7 días	mié 19/08/26	mar 25/08/26	201
205	SUMINISTRO DE EE.EE. (INC. MURETE)	6 días	mié 26/08/26	lun 31/08/26	204
206	**SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO**	**15 días**	**mar 1/09/26**	**mar 15/09/26**	
207	CONTROLADOR DE TRÁFICO (SUMINISTRO E INSTALA	3 días	mar 1/09/26	jue 3/09/26	205
208	SEMÁFORO ADOSADO VEHICULAR IC-3L CON LED'S	4 días	vie 4/09/26	lun 7/09/26	207
209	SEMAFORO PEATONAL 1C-2L CON LED'S	5 días	mar 8/09/26	sáb 12/09/26	208
210	SEMAFORO LED CONTADOR HORARIO 300 mm ADOS.	3 días	dom 13/09/26	mar 15/09/26	209
211	**VARIOS**	**275 días**	**lun 22/12/25**	**mar 22/09/26**	
212	DUCTO DE CONCRETO	140 días	lun 22/12/25	dom 10/05/26	184CC
213	BLOQUE DE CONCRETO CONTRA IMPACTO	7 días	mié 16/09/26	mar 22/09/26	210
214	**PANELES SOLARES**	**151 días**	**sáb 2/05/26**	**mar 29/09/26**	
215	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**60 días**	**sáb 2/05/26**	**mar 30/06/26**	
216	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS	60 días	sáb 2/05/26	mar 30/06/26	113CC
217	**ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE**	**60 días**	**sáb 2/05/26**	**mar 30/06/26**	
218	ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE	60 días	sáb 2/05/26	mar 30/06/26	216CC
219	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	60 días	sáb 2/05/26	mar 30/06/26	216CC
220	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y PANELES S**	**151 días**	**sáb 2/05/26**	**mar 29/09/26**	
221	COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA	90 días	sáb 2/05/26	jue 30/07/26	216CC
222	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC Ø 2"-P	90 días	sáb 2/05/26	jue 30/07/26	221CC
223	COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL PRO	90 días	sáb 2/05/26	jue 30/07/26	222CC
224	COLOCACIÓN DE CAJA DE PASE	90 días	dom 3/05/26	vie 31/07/26	223CC+1 día
225	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE LUMINARIA C	60 días	sáb 1/08/26	mar 29/09/26	224
226	**MOBILIARIO URBANO**	**50 días**	**sáb 29/08/26**	**sáb 17/10/26**	
227	**TACHOS DE BASURA**	**19 días**	**mar 1/09/26**	**sáb 19/09/26**	
228	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**	**4 días**	**mar 1/09/26**	**vie 4/09/26**	
229	EXCAVACION MANUAL	4 días	mar 1/09/26	vie 4/09/26	117FC+3 días
230	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	1 día	vie 4/09/26	vie 4/09/26	229FF
231	**CONCRETO SIMPLE**	**11 días**	**sáb 5/09/26**	**mar 15/09/26**	
232	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 PARA LOSAS DE FONDO	1 día	lun 14/09/26	lun 14/09/26	233
233	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSA	9 días	sáb 5/09/26	dom 13/09/26	229
234	CURADO DE LOSA DE CONCRETO	1 día	mar 15/09/26	mar 15/09/26	232
235	**ACABADOS**	**5 días**	**mar 15/09/26**	**sáb 19/09/26**	
236	ACABADO PULIDO e=1cm	1 día	mar 15/09/26	mar 15/09/26	232
237	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHOS DE BASURA	4 días	mié 16/09/26	sáb 19/09/26	236
238	**BANCAS DE MADERA**	**22 días**	**sáb 29/08/26**	**sáb 19/09/26**	
239	**SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS**	**22 días**	**sáb 29/08/26**	**sáb 19/09/26**	
240	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS	22 días	sáb 29/08/26	sáb 19/09/26	117
241	**SUMINISTRO Y COLOCACIONDE BOLARDOS**	**47 días**	**mar 1/09/26**	**sáb 17/10/26**	
242	SUMINISTRO Y COLOCACIO DE BOLARDOS	47 días	mar 1/09/26	sáb 17/10/26	229CC
243	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS BII**	**8 días**	**sáb 10/10/26**	**sáb 17/10/26**	
244	SUMINISTRO E INSTALACIONES DE TACHAS REFLECTIVAS	8 días	sáb 10/10/26	sáb 17/10/26	175
245	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIGIMNASIO**	**2 días**	**sáb 10/10/26**	**dom 11/10/26**	
246	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINIGIMNASIO	2 días	sáb 10/10/26	dom 11/10/26	244CC
247	**GUARDAVIA**	**5 días**	**sáb 10/10/26**	**mié 14/10/26**	
248	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAVIA	5 días	sáb 10/10/26	mié 14/10/26	246CC
249	**TOPELLANTAS**	**40 días**	**mar 8/09/26**	**sáb 17/10/26**	
250	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	40 días	mar 8/09/26	sáb 17/10/26	116
251	**PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
252	ELABORACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	5 días	sáb 26/04/25	mié 30/04/25	
253	EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	252CC
254	**PLAN DE MANEJO AMBIENTAL**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
255	**MANEJO DE EFLUIENTE Y RESIDUOS SOLIDOS**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
256	ALQUILER DE BAÑOS QUIMICOS	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	253CC
257	CONTENEDOR DE RESIDUOS SOLIDO NO PELIGROSO	5 días	sáb 26/04/25	mié 30/04/25	256CC
258	GESTIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROS	5 días	mar 13/10/26	sáb 17/10/26	256FF
259	**PLAN DE SEÑALIZACION**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
260	SEÑALIZACION TEMPORAL DE PLAN AMBIENTAL Y SEGU	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	257CC
261	**PLAN DE AREAS AUXILIARES**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
262	RIEGO PARA MITIGACION DEL POLVO	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	256CC
263	**PLAN DE ASUNTOS AMBIENTALES**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
264	CAPACITACION DIRIGIDA A LOS TRABAJADORES SOBRE E	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	262CC
265	**PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL**	**523 días**	**sáb 26/04/25**	**mié 30/09/26**	
266	MONITOREO DE LA CALIDAD DE RUIDO AMBIENTAL	523 días	sáb 26/04/25	mié 30/09/26	264CC
267	MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE	523 días	sáb 26/04/25	mié 30/09/26	266CC
268	**PLAN DE CONTINGENCIA**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
269	RECURSO PARA RESPUESTA ANTE PLAN DE CONTIGENCI	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	266CC
270	**PLAN DE REFORESTACIÓN**	**90 días**	**lun 20/07/26**	**sáb 17/10/26**	
271	ARBORIZACIÓN CON FINES DE RECUPERACIÓN Y PROTE	90 días	lun 20/07/26	sáb 17/10/26	264FF
272	**PLAN DE DESVIO VEHICULAR**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
273	**TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE DE VIAS ALTERNAS**	**456 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 25/07/26**	
274	TRAZO Y REPLANTEO	400 días	sáb 26/04/25	sáb 30/05/26	5CC
275	CORTE DE MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA P/TRATAI	400 días	sáb 26/04/25	sáb 30/05/26	274CC
276	PERFILADO Y COMPACTACION DE VIAS ALTERNAS	400 días	sáb 26/04/25	sáb 30/05/26	275CC
277	BASE GRANULAR E=20 m	400 días	sáb 26/04/25	sáb 30/05/26	276CC
278	IMPRIMACION ASFALTICA	395 días	jue 1/05/25	sáb 30/05/26	277CC+5 días
279	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE E= 1"	395 días	jue 1/05/25	sáb 30/05/26	278CC
280	PINTURA DE TRAFICO CONTINUA Y DISCONTINUA	400 días	dom 1/06/25	dom 5/07/26	279CC+31 días
281	MARCA EN EL PAVIMENTO	390 días	mar 1/07/25	sáb 25/07/26	280CC+30 días
282	DESBROCE Y LIMPIEZA DE VIAS ALTERNAS	35 días	jue 7/05/26	mié 10/06/26	281CC+310 días
283	DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO	30 días	dom 11/05/25	lun 9/06/25	5CC+15 días

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
284	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	400 días	sáb 26/04/25	sáb 30/05/26	274CC
285	PARCHADO PROFUNDO CON MAC	30 días	lun 11/05/26	mar 9/06/26	5CC+380 días
286	**DESVIO VEHICULAR**	**540 días**	**sáb 26/04/25**	**sáb 17/10/26**	
287	MANTENIMIENTO DE TRANSITO PERMANENTE	540 días	sáb 26/04/25	sáb 17/10/26	274CC
288	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFORO PROVISION	15 días	jue 16/04/26	jue 30/04/26	287CC+355 días
289	**ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN VIAS ALTERNAS**	**61 días**	**sáb 26/04/25**	**mié 25/06/25**	
290	TRAZO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS	5 días	sáb 26/04/25	mié 30/04/25	274CC
291	EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS	7 días	jue 1/05/25	mié 7/05/25	290
292	COLOCACIÓN DE CAMA DE ARENA	3 días	jue 8/05/25	sáb 10/05/25	291
293	RELLENO CON MATERIAL PROPIO/EQUIPO	5 días	dom 18/05/25	jue 22/05/25	298
294	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	3 días	vie 23/05/25	dom 25/05/25	293
295	CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA CABEZALES	15 días	dom 1/06/25	dom 15/06/25	296
296	ACERO FY=4200 KG/CM2, EN CABEZALES	9 días	vie 23/05/25	sáb 31/05/25	293
297	EMBOQUILLADO DE PIEDRA E=0.15 M	10 días	lun 16/06/25	mié 25/06/25	295
298	ALCANTARILLA TMC Ø 36", E=2.0 MM	7 días	dom 11/05/25	sáb 17/05/25	292
299	**PLAN DE DIFUSION**	**500 días**	**jue 5/06/25**	**sáb 17/10/26**	
300	IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS DE DIFUSION	500 días	jue 5/06/25	sáb 17/10/26	252FC+35 días
301	**PLAN DE GESTION SOCIAL**	**500 días**	**jue 5/06/25**	**sáb 17/10/26**	
302	ELABORACIÓN E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTI	500 días	jue 5/06/25	sáb 17/10/26	300CC
303	**PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO**	**250 días**	**lun 26/05/25**	**vie 30/01/26**	
304	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO	250 días	lun 26/05/25	vie 30/01/26	287CC+30 días
305	FIN	0 días	sáb 17/10/26	sáb 17/10/26	177

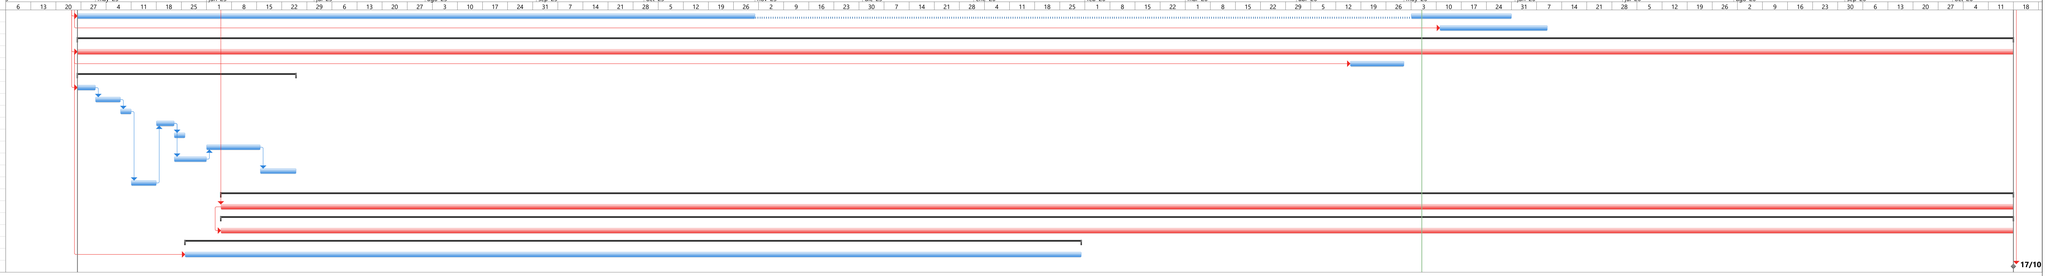

Proyecto: PROGRAMACIÓN AC
Fecha: mié 6/05/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
